

PŘÍLOHA č. 1

I/11 Vikýřovice - Rapotín 3261 m (šířka AHV 7,5m)				
29.04.2020	dní	množství	jednotka	dělníci
SO 101 - ETAPA I - pravá strana				
zařízení staveniště	1	0	0	2
sonda pro odběr vzorku na recepturu	1	1	m	3
Frézování (4500t)	5	12663	m2	3
Recyklace za studena (1 polovina)	8	12663	m2	0
Ošetřování recyklace (1 polovina)	5	12663	m2	0
Odstranění přebytků po recyklaci	2	12663	m2	2
pokládka ACP 16+ mod (60 mm)	2	12663	m2	0
pokládka ACl 16+ mod (50 mm)	2	12663	m2	0
pokládka SMA 11S mod (40 mm)	2	12663	m2	0
lokální oprava na mostě ev.č. 11-095	3	88	m2	2
vybourání silniční obruby + přídlažby	6	429	m	3
osazení nové silniční obruby + přídlažby	12	429	m	3
vybourání přídlažby	4	944	m	3
osazení nové přídlažby	8	944	m	3
čela propustku - dláždění	2	20	m2	3
SO 101 - ETAPA II - levá strana				
Frézování (4500t)	5	12663	m2	3
odstranění krajnice (282 m3 = 550 t)	3	2513	m	0
Recyklace za studena (1 polovina) - 2,2km	8	12663	m2	0
Ošetřování recyklace (1 polovina) - 2,2km	5	12663	m2	0
Odstranění přebytků po recyklaci	2	12663	m2	2
čištění příkopů od nánosu	4	2408	m	0
pokládka ACP 16+ mod (60 mm) - 2,2km	3	12663	m2	0
pokládka ACl 16+ mod (50 mm)- 2,2km	3	12663	m2	0
pokládka SMA 11S mod (40 mm)- 2,2km	3	12663	m2	0
pokládka krajnic (500t)	1	2513	m	0
zastávka BUS - odstranění	1	96	m2	2
zastávka BUS - ŠD 0/32	1	96	m2	2
zastávka BUS - podkladní beton	1	88	m2	2
zastávka BUS - dláždění - SUB (včetně zrání betonu)	25	80	m2	0
vybourání silniční obruby	2	200	m	3
osazení nové silniční obruby	3	200	m	3
vybourání přídlažby	2	200	m	3
osazení nové přídlažby	3	200	m	3
vybourání UV komplet	2	5	ks	3
osazení nových UV komplet	3	5	ks	3
výměna mříže/skruže UV	1	4	ks	3
VDZ v barvě + dopravní knoflíky	6	3261	m	0
VDZ v plastu + protismykový povrch	5	3261	m	0

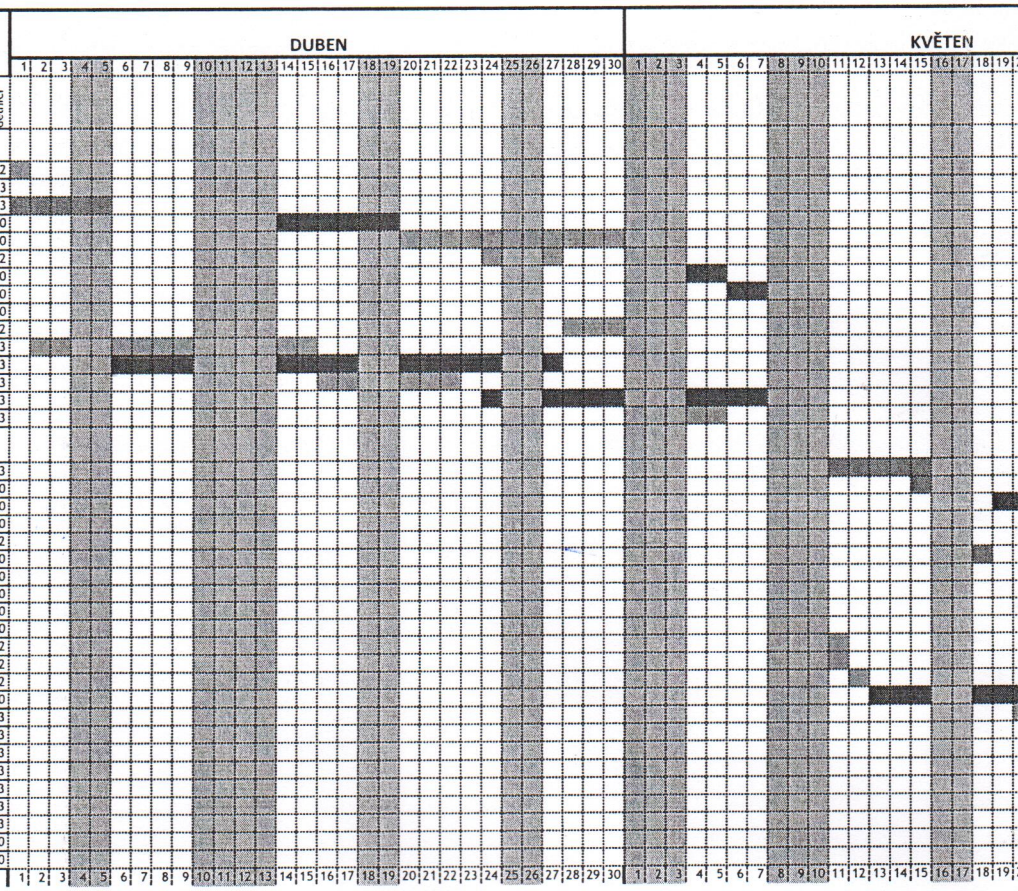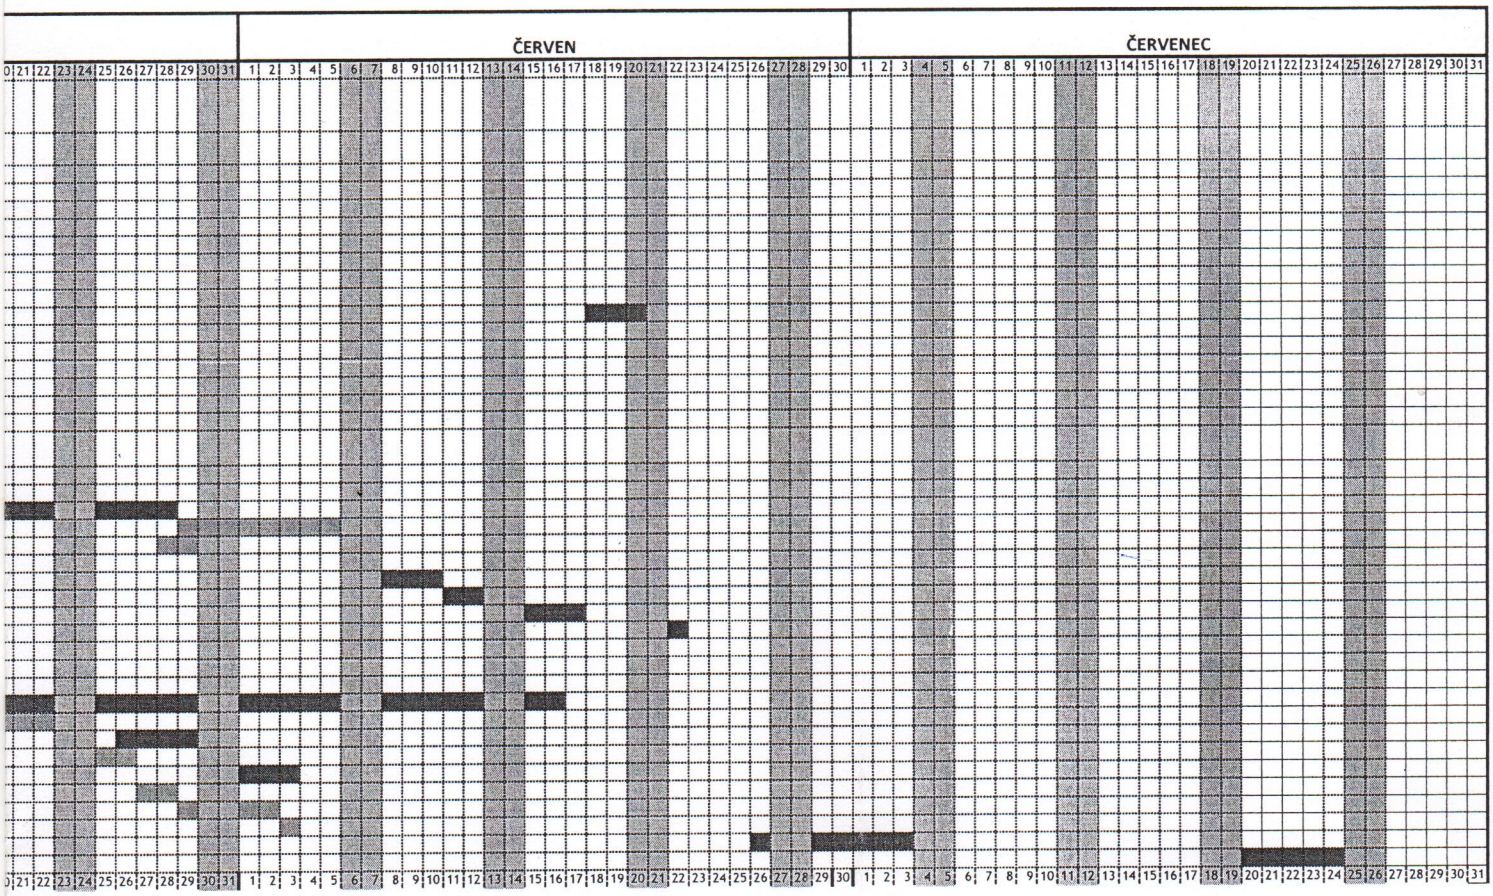


ČERVEN
ČERVENEC
